

Migration des données utilisateurs

vers le nouveau serveur TSE-BOOST

Référence	PROJ-TSE-BOOST-2026
Version	1.0
Date	1 octobre 2025
Statut	Terminé
Périmètre	Migration profils utilisateurs — Serveur TSE-BOOST

Table des matières

1. Contexte et objectifs	3
1.1 Contexte du projet.....	3
1.2 Objectifs.....	3
1.3 Périmètre	3
2. Architecture et infrastructure	4
2.1 Comparatif des serveurs.....	4
2.2 Configuration du rôle TSE-BOOST	4
Rôles Windows Server installés	4
Configuration réseau et DNS.....	4
Licences	4
3. BOT de prise de rendez-vous Microsoft 365	5
3.1 Description du dispositif	5
3.2 Flux de prise de rendez-vous.....	5
3.3 Contenu de l'e-mail envoyé aux utilisateurs	5
4. Processus de migration des données.....	6
4.1 Outil retenu : Robocopy	6
4.2 Étapes de migration	6
Étape 1 — Inventaire et audit.....	6
Étape 2 — Copie initiale complète	6
Étape 3 — Synchronisations delta (incrémentales).....	6
Étape 4 — Copie finale lors de la bascule.....	6
4.3 Vérification des données migrées	6
5. Prise en main et accompagnement des utilisateurs	7
5.1 Déroulement de l'intervention (30 min par utilisateur)	7
5.2 Cas typiques rencontrés et résolutions	7
6. Planning du projet — Diagramme de Gantt.....	8
7. Suivi post-migration et support	10
7.1 Organisation du support.....	10
7.2 Indicateurs de suivi	10
7.3 Procédure de clôture du projet.....	10
8. Annexes	11
Annexe A — Commandes Robocopy de référence	11
Annexe B — Paramètres Robocopy expliqués	11
Annexe C — Contacts projet	11

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure informatique, la décision a été prise de migrer l'environnement de travail distant (TSE — Terminal Service Environment) vers un nouveau serveur baptisé TSE-BOOST.

L'ancien serveur TSE présente des limitations significatives en termes de performances et de support : matériel vieillissant, système d'exploitation en fin de support, saturation des ressources et risques de sécurité accrus. Le nouveau serveur TSE-BOOST est dimensionné pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'organisation.

Ce livrable décrit l'ensemble du projet de migration : depuis la préparation de l'infrastructure jusqu'à l'accompagnement personnalisé des utilisateurs, en passant par la configuration du BOT de prise de rendez-vous Microsoft 365 et le suivi post-migration.

1.2 Objectifs

- Migrer l'intégralité des dossiers utilisateurs (profils, documents, paramètres) depuis l'ancien serveur TSE vers TSE-BOOST sans perte de données.
- Garantir une continuité de service maximale : les utilisateurs retrouvent leurs données à l'identique sur le nouveau serveur.
- Organiser des créneaux de prise en main à distance via un BOT de rendez-vous Microsoft 365, permettant de vérifier le bon fonctionnement et d'accompagner chaque utilisateur.
- Assurer un suivi structuré des incidents post-migration (applications manquantes, paramètres non restitués, etc.).

1.3 Périmètre

Élément	Inclus dans le projet	Hors périmètre
Profils utilisateurs	Dossiers Users\$ complets	Données serveurs applicatifs
Configuration RDP/TSE	Rôle TSE, licences CAL, DNS	Migration bases de données
Suivi des utilisateurs	Prise en main + accompagnement	Formation aux nouveaux outils
Support post-migration	J+30 après bascule finale	Maintenance matérielle

2. Architecture et infrastructure

2.1 Comparatif des serveurs

Caractéristique	Ancien serveur TSE	Nouveau serveur TSE-BOOST
OS	Windows Server 2022 Standard Edition (Build 20348) (64-bit)s	Windows Server 2025 Standard Edition (Build 26100) (64-bit)
CPU	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz	Intel(R) Core(TM) i7-14700
RAM	214,89 GB DDR4	133,7 GB DDR5
Stockage	RAID 1395.1 Go	SSD 3725.1 Go
Réseau	1.0 Gbps	1.0 Gbps
Support Microsoft	Actif	Actif
TPM / Secure Boot	Oui	Oui

2.2 Configuration du rôle TSE-BOOST

Rôles Windows Server installés

- Remote Desktop Services (RDS) — Rôle principal Terminal Services
- Remote Desktop Session Host (RDSH) — Hébergement des sessions utilisateurs
- Remote Desktop Licensing (RDL) — Gestion des licences CAL RDS
- Remote Desktop Gateway (RDG) — Accès sécurisé depuis l'extérieur (optionnel)
- DNS Client — Résolution de noms configurée vers les DNS d'entreprise

Configuration réseau et DNS

- Nom du serveur : TSE-BOOST
- Adresse IP statique configurée dans la plage de gestion IT
- Enregistrements DNS A et PTR créés dans la zone interne
- Alias DNS (CNAME) : TSE.domain.X.fr → TSE-BOOST.domain.X.fr (anonymisé)
- Joint au domaine Active Directory de l'entreprise

Licences

- Licences CAL RDS par utilisateur (User CAL) — transférées depuis l'ancien serveur
- Serveur de licences RDS configuré et activé auprès de Microsoft
- Clés d'activation vérifiées avant la mise en production

3. BOT de prise de rendez-vous Microsoft 365

3.1 Description du dispositif

Afin d'organiser efficacement la prise en main sur chaque poste utilisateur, un BOT de planification a été déployé via Microsoft 365 Bookings. Ce service apparaît directement dans le calendrier Outlook des techniciens et permet aux utilisateurs de réserver eux-mêmes leur créneau d'intervention.

Paramètre	Valeur / Description
Outil utilisé	Microsoft 365 Bookings
Intégration	Calendrier Outlook des techniciens IT
Accès utilisateur	Lien personnalisé envoyé par e-mail à chaque utilisateur
Durée par créneau	30 minutes maximum par utilisateur
Plages horaires	Jours ouvrés, 9h–18h
Rappel automatique	E-mail de rappel 24h avant le rendez-vous
Technicien assigné	Attribution automatique selon disponibilité

3.2 Flux de prise de rendez-vous

1. L'équipe IT envoie à chaque utilisateur un e-mail contenant le lien Microsoft Bookings personnalisé.
2. L'utilisateur clique sur le lien et accède à la page de réservation.
3. Il choisit un créneau disponible dans le calendrier et confirme sa réservation.
4. Une confirmation automatique est envoyée par e-mail (avec lien Teams ou accès à distance si applicable).
5. Le créneau apparaît dans le calendrier Outlook du technicien IT assigné.
6. Un rappel automatique est envoyé 24h avant l'intervention.
7. À l'heure prévue, le technicien prend la main sur le poste et effectue la vérification/accompagnement.

3.3 Contenu de l'e-mail envoyé aux utilisateurs

Objet : Migration de votre espace de travail TSE — Prenez votre rendez-vous

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la migration de notre serveur d'accès distant (TSE) vers le nouveau serveur TSE-BOOST, votre espace de travail va être transféré afin que vous retrouviez l'ensemble de vos données sans aucun changement.

Afin de nous assurer que tout fonctionne correctement sur votre poste, un technicien IT prendra contact avec vous lors d'un créneau de 30 minutes pour vérifier votre environnement et répondre à vos questions.

Veuillez réserver votre créneau en cliquant sur le lien ci-dessous :

→ [\[LIEN MICROSOFT BOOKINGS\]](#)

L'équipe IT reste disponible pour toute question à l'adresse support@acitechnology.fr

Cordialement, L'équipe IT

4. Processus de migration des données

4.1 Outil retenu : Robocopy

La migration des profils et dossiers utilisateurs est réalisée avec Robocopy (Robust File Copy), outil natif Windows. Ce choix garantit la préservation des droits NTFS (ACL), des attributs de fichiers et des horodatages, éléments essentiels à la conformité des profils TSE.

4.2 Étapes de migration

Étape 1 — Inventaire et audit

- Lister les dossiers utilisateurs sur \\ANCIEN-TSE\Users\$ et mesurer la taille totale à migrer.
- Vérifier l'espace disponible sur TSE-BOOST (minimum 2x la taille source).
- Identifier les profils actifs et ceux pouvant être archivés.

Étape 2 — Copie initiale complète

Lancement de la commande Robocopy :

```
# Copie complète d'un dossier utilisateur (hormis le dossier AppData et dossiers gérés par Windows)
robocopy "\\SRVTSEA\nomuser$" "C:\Users\nomuser" /E /COPYALL /DCOPY:DAT /XJ /ZB /XO /R:3 /W:5 /V /TS /FP /LOG:"C:\backup_sync.log" /TEE /XD AppData NTUSER.DAT NTUSER.DAT.*
ntuser.ini *.ms-ad
```

Étape 3 — Synchronisations delta (incrémentales)

Des synchronisations quotidiennes sont exécutées pour ne copier que les fichiers modifiés depuis la dernière passe, réduisant au minimum la fenêtre de coupure lors de la bascule :

```
robocopy "\\ANCIEN-TSE\Users$" "\\TSE-BOOST\Users$" /MIR /COPYALL /XO /R:3 /W:5 /MT:8 /LOG+:C:\Logs\robocopy_delta.log /TEE
```

Étape 4 — Copie finale lors de la bascule

Lors de la fenêtre de maintenance, une dernière copie synchronisée est effectuée, puis l'alias DNS est redirigé vers TSE-BOOST. Les connexions RDP pointent automatiquement vers le nouveau serveur sans modification des paramètres utilisateurs.

4.3 Vérification des données migrées

#	Contrôle	Méthode	Statut attendu
1	Nombre de fichiers source = destination	Comptage Robocopy (log)	100 % concordance
2	Droits NTFS (ACL) préservés	lcacls / vérification manuelle	Identique à la source
3	Horodatages des fichiers inchangés	Comparaison attributs	Dates préservées
4	Profils utilisateurs accessibles en session TSE	Test ouverture de session	Profil chargé OK
5	Documents, favoris, paramètres disponibles	Vérification utilisateur lors du RDV	Validé avec l'utilisateur

5. Prise en main et accompagnement des utilisateurs

5.1 Déroulement de l'intervention (30 min par utilisateur)


Étape	Durée	Action du technicien	Validation
1	5 min	Connexion au poste via prise de main à distance (Teams / AnyDesk). Vérification de la connexion au nouveau TSE-BOOST.	Session RDP ouverte
2	5 min	Contrôle des données : présence des documents, bureau, favoris, dossiers personnels.	Données conformes
3	10 min	Vérification des applications métier installées. Lancement test de chaque application critique (ERP, Office, outils spécifiques).	Apps fonctionnelles
4	5 min	Contrôle des imprimantes, lecteurs réseau et raccourcis. Correction si nécessaire (remappage, recréation raccourci).	Périphériques OK
5	5 min	Questions de l'utilisateur, signalement d'anomalies, ouverture ticket si nécessaire. Clôture du rendez-vous.	Ticket créé ou RDV clos

5.2 Cas typiques rencontrés et résolutions

Problème constaté	Cause probable	Résolution
Application absente (ex. Calculatrice, Snipping Tool)	App non réinstallée sur TSE-BOOST	Déploiement via NinjaOne ou winget depuis la session technicien
Raccourci bureau manquant	Profil migré sans les raccourcis système	Recréation manuelle ou script PowerShell via NinjaOne
Imprimante réseau non disponible	Pilote non présent sur TSE-BOOST	Installation pilote + remappage de l'imprimante
Lecteur réseau non mappé	Script de logon non exécuté	Exécution manuelle du script de mappage ou GPO
Profil lent au chargement	Profil volumineux (cache Teams, Outlook)	Nettoyage cache applicatif + déplacement données lourdes
Paramètres applicatifs perdus	Config stockée en dehors du profil	Identification du chemin de config et copie manuelle depuis l'ancien serveur
Impossible de se connecter au TSE-BOOST	DNS non mis à jour côté client	Flush DNS (ipconfig /flushdns) sur le poste client

6. Planning de la migration de données des utilisateurs — Diagramme de Gantt

Le planning couvre 8 semaines, de la phase de planification initiale jusqu'au suivi post-migration. Chaque phase est représentée par une couleur distincte dans le diagramme ci-dessous.

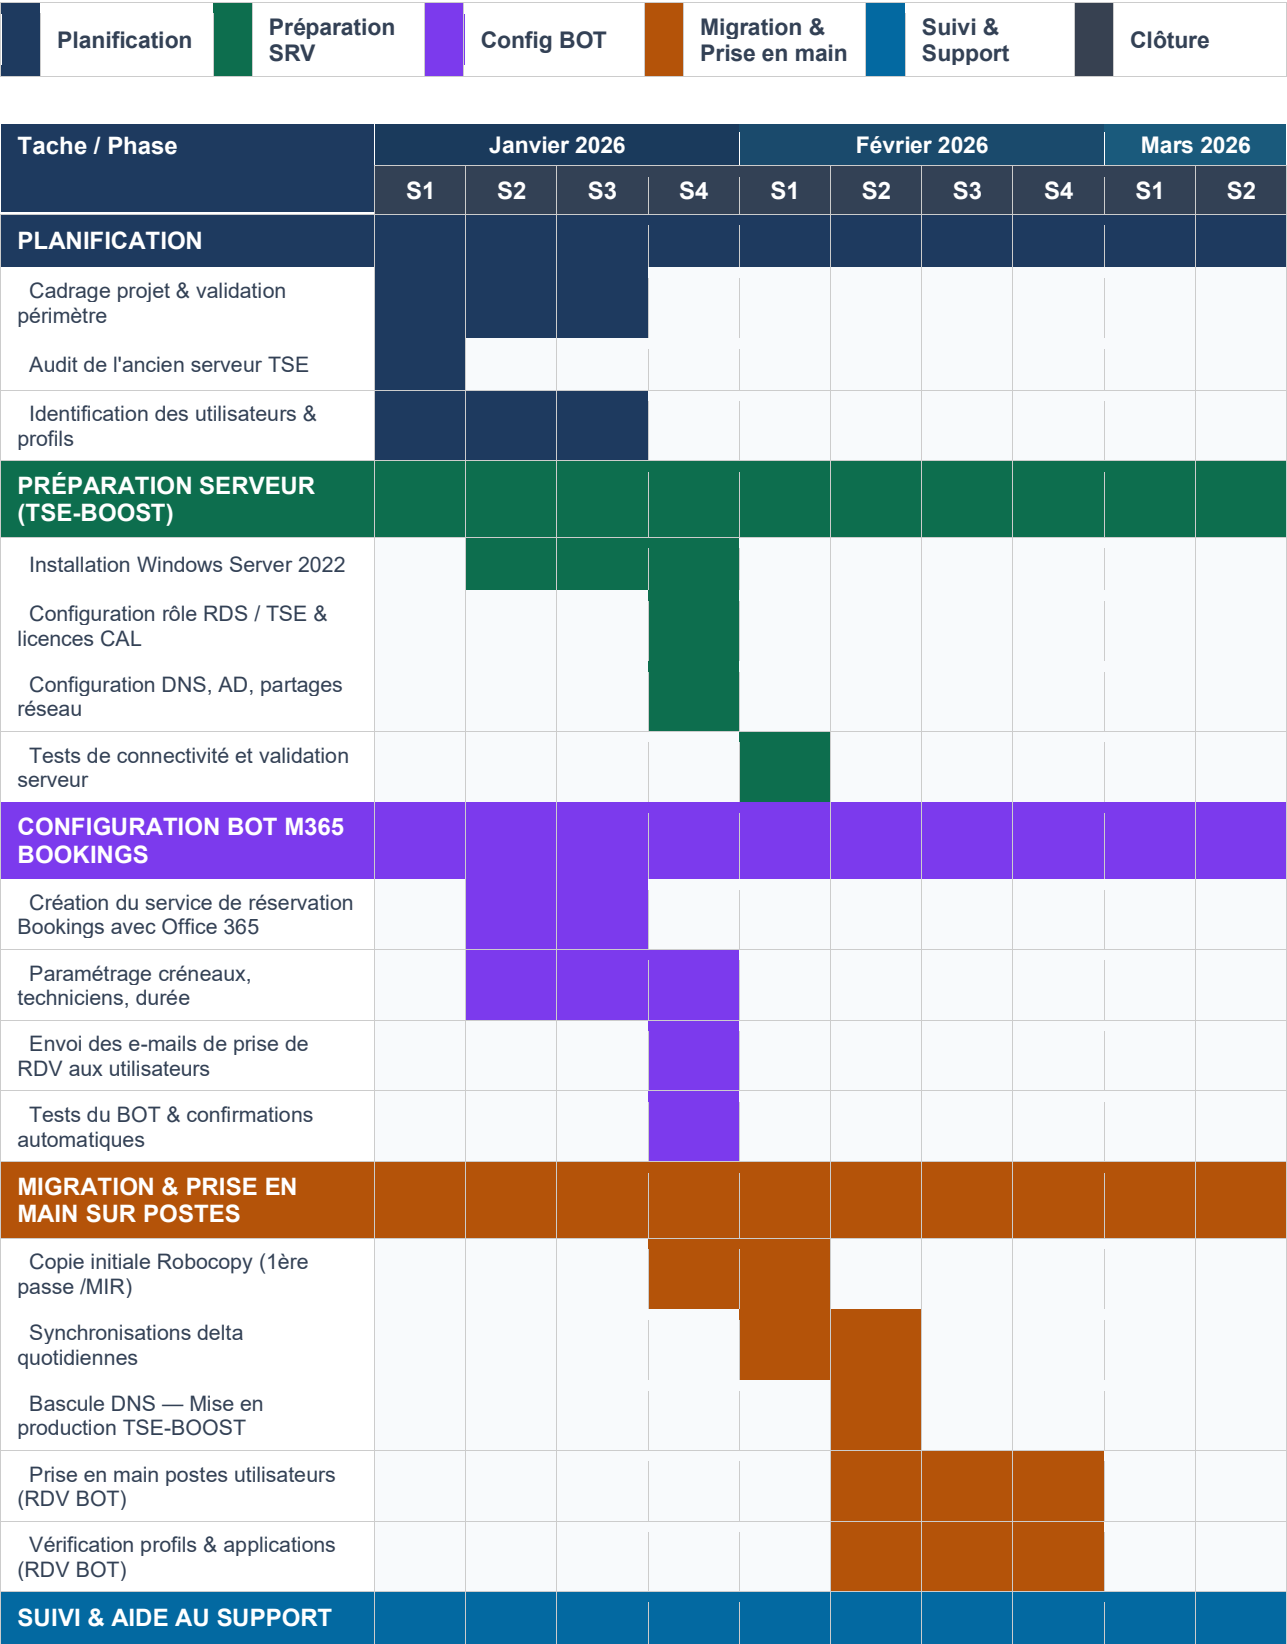

Traitement tickets post-migration (apps, raccourcis)										
Déploiement correctifs via NinjaOne										
Point hebdomadaire suivi avancement										
CLÔTURE										
Bilan post-migration & rapport final										
Désactivation ancien serveur TSE										

Note : les semaines correspondent aux semaines calendaires du projet. La bascule DNS (mise en production de TSE-BOOST) est prévue en semaine 5, correspondant à la fenêtre de maintenance validée avec les équipes métier.

7. Suivi post-migration et support

7.1 Organisation du support

Pendant les 4 semaines suivant la mise en production de TSE-BOOST, un dispositif de support renforcé est mis en place pour traiter rapidement les incidents remontés par les utilisateurs.

- Canal de support dédié : e-mail support@acitechnology.fr ou ticket ITSM avec étiquette [TSE-BOOST]
- SLA de traitement : tickets critiques (impossibilité de travailler) sous 2h, tickets standards sous 8h ouvrées
- Point hebdomadaire avec le responsable IT : synthèse des incidents, correctifs déployés, taux de résolution
- Déploiement des correctifs récurrents via tâches NinjaOne (scripts PowerShell, réinstallation d'applications)

7.2 Indicateurs de suivi

Indicateur	Cible	Fréquence de mesure
Taux d'utilisateurs migrés avec validation OK	> 95 %	Hebdomadaire
Nombre de tickets post-migration ouverts	Décroissant	Hebdomadaire
Délai moyen de résolution des incidents	< 4h ouvrées	Hebdomadaire
Taux de satisfaction utilisateurs (enquête rapide)	> 80 % satisfaits	Fin de projet
Disponibilité du serveur TSE-BOOST	> 99,5 %	En continu

7.3 Procédure de clôture du projet

8. Collecte de l'ensemble des tickets traités et compilation du rapport post-migration.
9. Réunion de bilan avec le responsable IT et les parties prenantes.
10. Validation formelle de la migration par le commanditaire.
11. Désactivation de l'ancien serveur TSE (mise hors réseau, conservation en archive 30 jours).
12. Archivage de la documentation (livrable, logs Robocopy, tickets) dans le système de gestion documentaire.

8. Annexes

Annexe A — Commandes Robocopy de référence

```
# Copie complète d'un dossier utilisateur (hormis le dossier AppData et dossiers gérés par Windows)
robocopy "\\SRVTSEA\nomuser$" "C:\Users\nomuser" /E /COPYALL /DCOPY:DAT /XJ /ZB /XO /R:3 /W:5 /V /TS /FP /LOG:"C:\backup_sync.log" /TEE /XD AppData NTUSER.DAT NTUSER.DAT.*
ntuser.ini *.ms-ad
```

Annexe B — Paramètres Robocopy expliqués

Paramètre	Description
/E	Copie tous les sous-dossiers, y compris les vides
/COPYALL	Copie données + ACL + attributs + timestamps + propriétaire
/DCOPY:DAT	Copie aussi les attributs des dossiers (Date, Attributs, Timestamps)
/XO	Ignore les fichiers plus récents côté destination (mode incrémental)
/ZB	Mode reprise si fichier verrouillé, bascule en mode Backup si accès refusé
/XJ	Exclut les jonctions (liens symboliques) — évite les boucles infinies
Paramètre	Rôle
/E	Copie tous les sous-dossiers, y compris les vides
/COPYALL	Copie données + ACL + attributs + timestamps + propriétaire

Annexe C — Contacts projet

Rôle	Nom	Service	Contact
Chef de projet IT	À compléter	DSI / IT	—
Technicien principal	À compléter	Infrastructure	—
Support helpdesk	À compléter	Support IT	support@acitechnology.fr
Responsable métier	À compléter	Direction	—
